



รายการงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โรงพยาบาลพังงา
ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น

โรงพยาบาลพังงา

- ปีงบประมาณ 2566 ได้รับจัดสรร 52,116,000 บาท
- ส่วนที่เหลือจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้น 194,772,888 บาท โดยรวมแล้วได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 246,888,888 บาท
- ผู้รับจ้าง บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- สัญญาจ้างเลขที่ 342/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566
- วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 28 กันยายน 2566
- ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 27 กันยายน 2566
- สิ้นสุดสัญญาเดิม วันที่ 25 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 (ขยายเวลา 43 วัน)
- บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง วันที่ 10 เมษายน 2567
- ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง จำนวน 31 งวด/863 วัน
- ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566เป็นต้นไป

อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น

- งวดที่ 1 เบิกจ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 6,172,222.20 บาท
- งวดที่ 2 เบิกจ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จำนวน 6,172,222.20 บาท
- งวดที่ 3 เบิกจ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2567 จำนวน 7,406,666.64 บาท
- งวดที่ 4 ครบกำหนด 19 กุมภาพันธ์ จำนวน 30 วัน จำนวนเงิน 4,937,777.76 บาท
 - หล่อคอนกรีตฐานรากส่วนที่เหลือ **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน เฉพาะพื้นและผนัง **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - หล่อคอนกรีตผนังห้องลิฟท์ชั้นใต้ดิน **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - จัดส่ง SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบชั้นที่ 2 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**
 - จัดส่ง SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้น 2 **ดำเนินการแล้วเสร็จ**

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีหนังสือส่งมอบลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตรวจรับมีมติวันที่ 24 มิถุนายน 2567

อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น

- งวดที่ 5 ครบกำหนด 15 มีนาคม 2567 จำนวน 25 วัน จำนวนเงิน 4,937,777.76 บาท
 - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นที่ 1 พร้อมเดินท่อระบบสุขาภิบาลส่วนที่อยู่ใต้พื้น
ระหว่างดำเนินการ (หล่อคานคอนกรีตบางส่วน)
 - ติดตั้ง SLEEVE, ท่อ CONDUIT, อุปกรณ์ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ของงานระบบทุกระบบ
 - จัดส่ง SHOP DRAWING ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบชั้นที่ 3
 - จัดส่ง SHOP DRAWING พื้นระบบ POST TENSION ชั้น 3


ผลการดำเนินงาน

คาดว่าจะส่งมอบได้วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ภาพหน้างานอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น



ภาพหน้างานอาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม คสล. 6 ชั้น

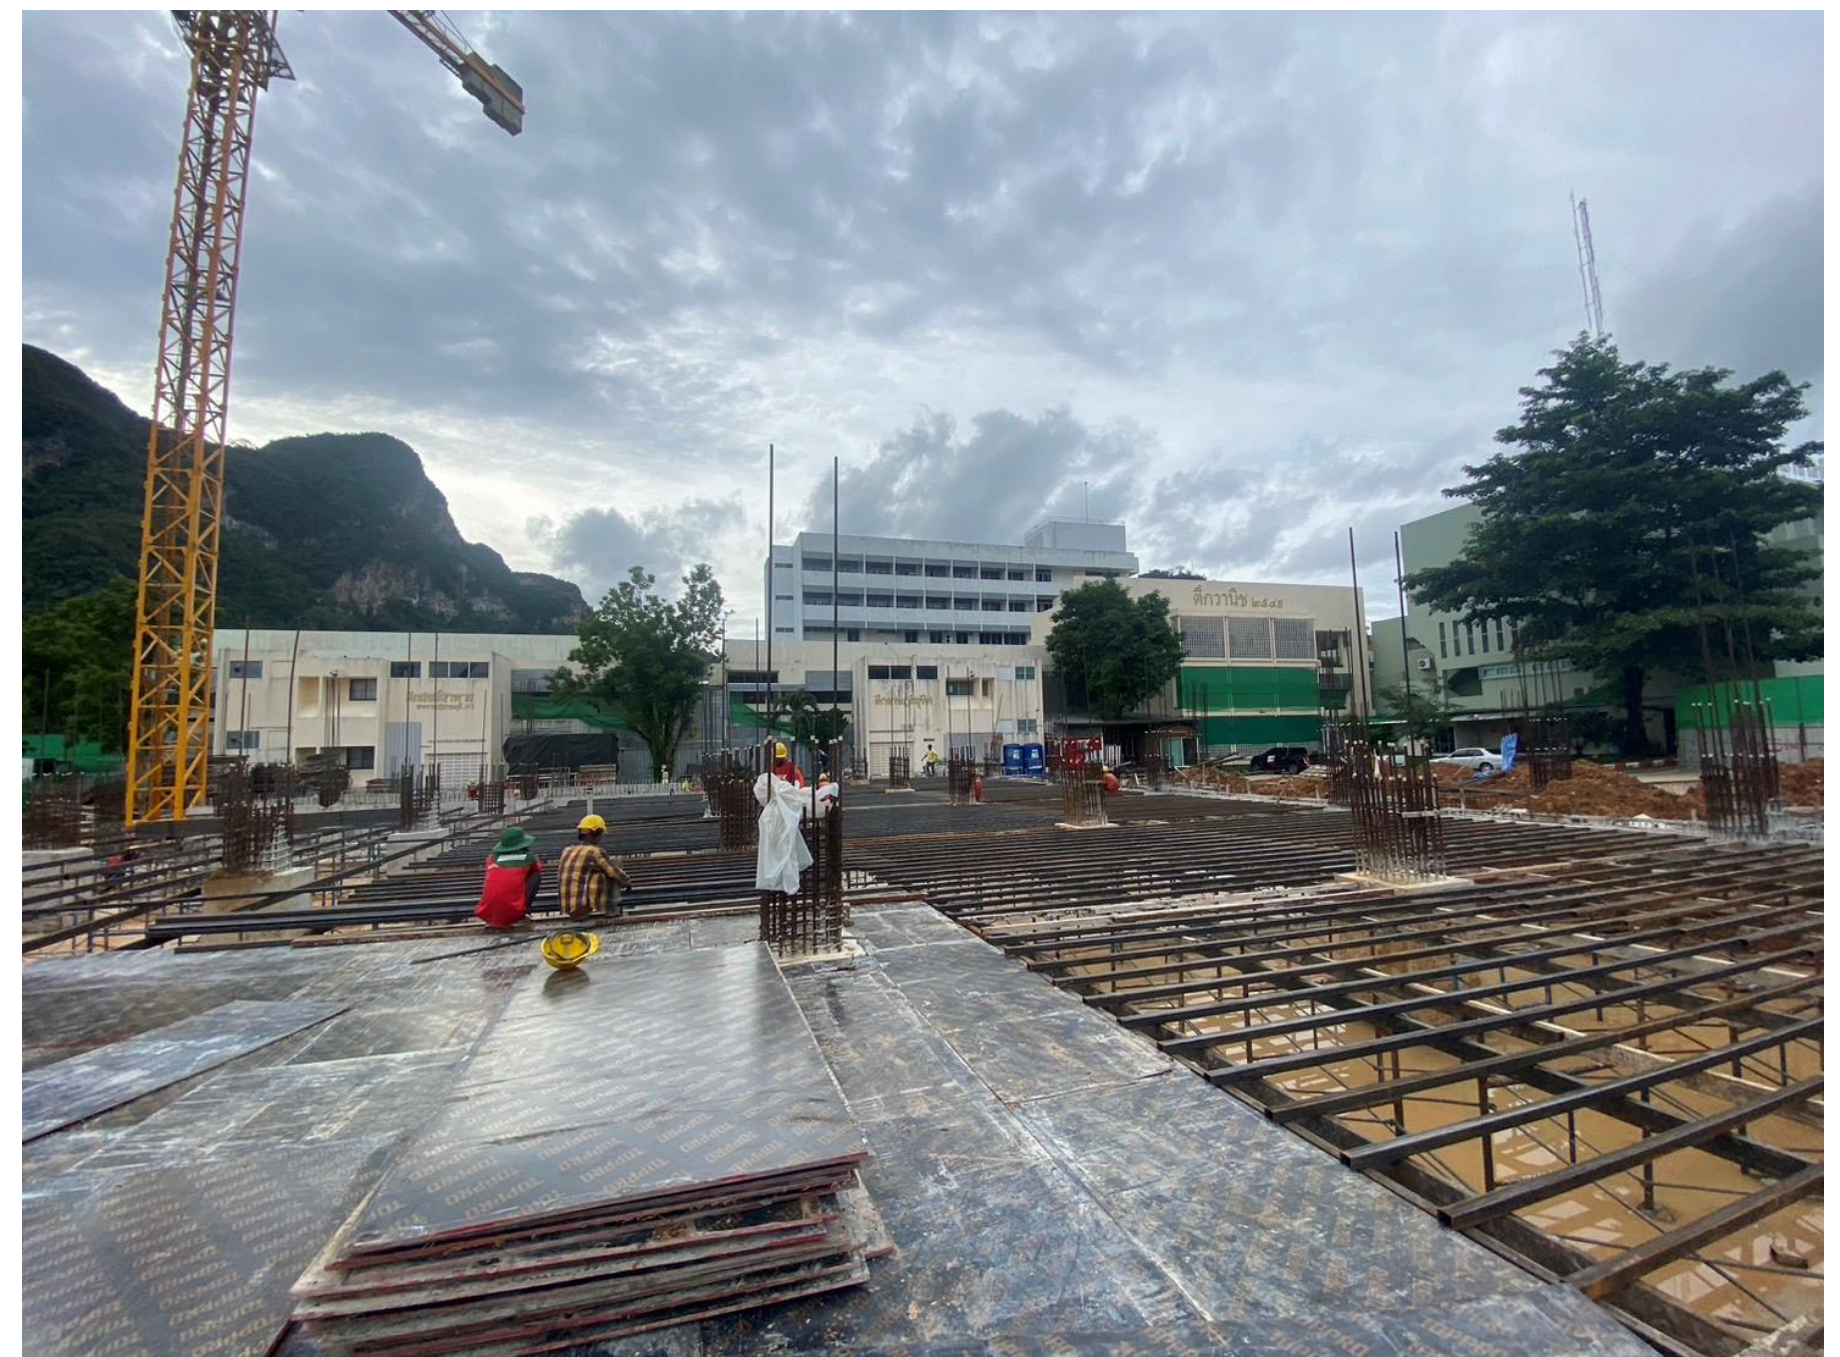


ชื่องสิทธิ์บรรทุกเตียงผู้ป่วย 2 ชั้น

- สัญญาเลขที่ 265/2566 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
- บริษัท ดี-ทีอ็อปส์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง จำนวน 2 งวด/90 วัน จำนวนเงิน 3,698,000 บาท
- บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567
 - ปรับลดวงเงิน เหลือ 3,671,739.20 บาท
- ครบสัญญาวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ค่าปรับวันละ 3,671.74 บาท
- งวดที่ 1 เบิกจ่ายวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยคิดค่าปรับเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้า เป็นเวลา 151 วัน (ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567) คิดเป็นเงินวันละ 3,671.74 บาท
รวมเป็นเงิน 554,432.74 บาท คงเหลือจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 898,506.46 บาท

ชื่องลิฟต์บรรจุทุกเตียงผู้ป่วย 2 ชั้น

- งวดที่ 2 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 2,218,800 บาท
 - ก่ออิฐผนัง – ผนวผนัง ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - งานเสาเข็มพร้อมทดสอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ฝ้าเพดาน ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ผนังพื้น ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - งานสี ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิง ลิฟต์เตียง พร้อมทดสอบทุกระบบและส่งรายงานและได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ
- เบิกจ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยคิดค่าปรับเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้า เป็นเวลา 63 วัน (ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567) คิดเป็นเงินวันละ 3,671.74 บาท รวมเป็นเงิน 231,319.62 บาท คงเหลือจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,987,480.38 บาท

ภาพหน้างานช่องลิฟต์บรรทุกเตียงผู้ป่วย 2 ชั้น

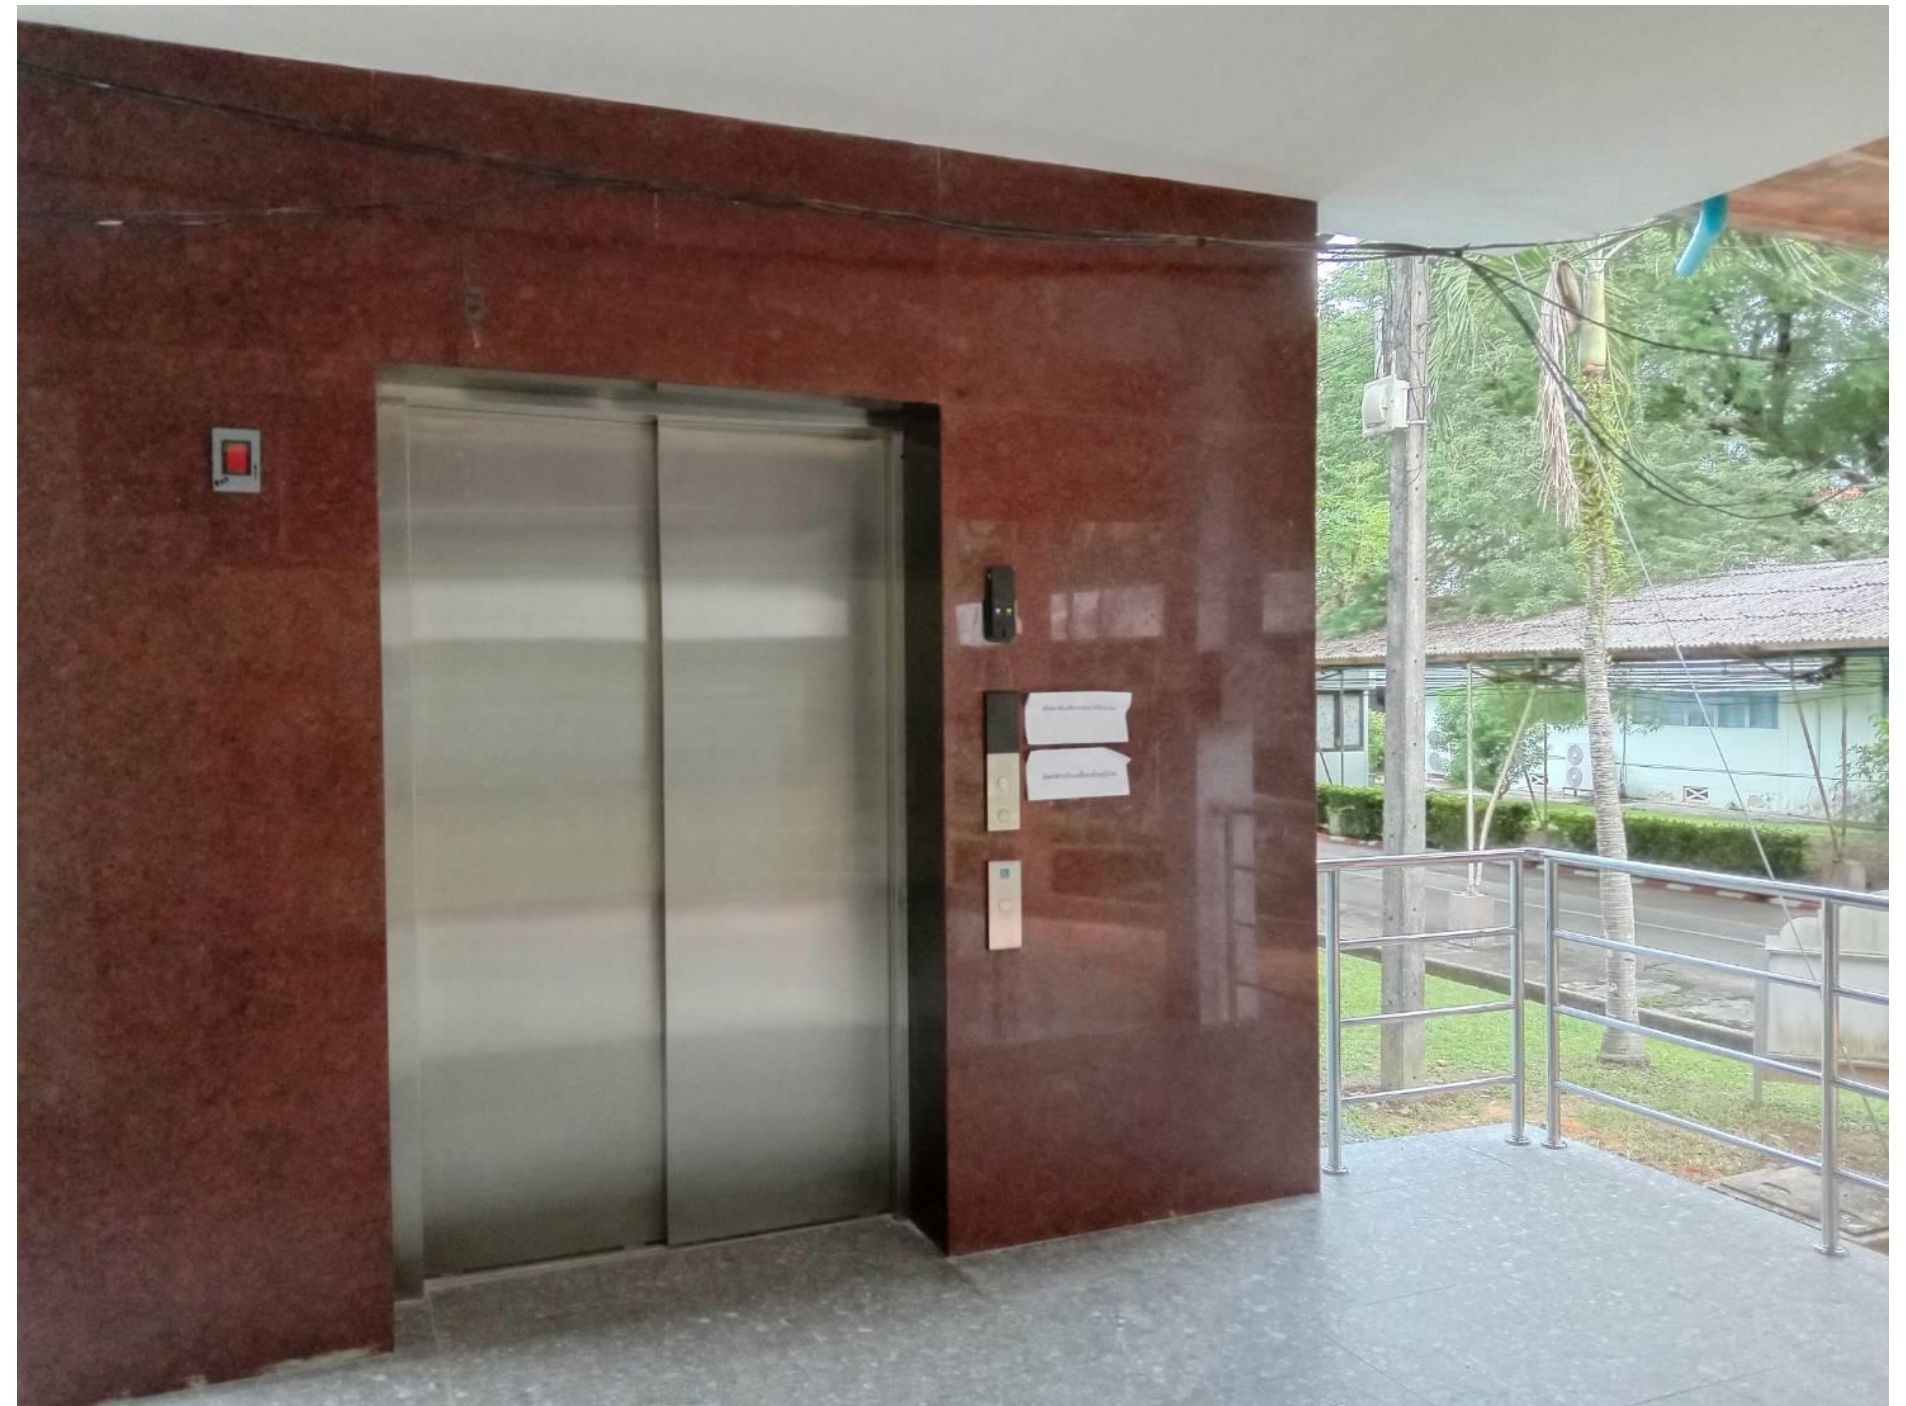

ทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาว 20.75 เมตร

โดยวิธีคัดเลือก

เงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณทั้งสิ้น 1,427,300.00 บาท

วงเงิน คงเหลือ หลังจากยกเลิกสัญญา เป็นเงิน จำนวน 1,019,621.82 บาท

- บริษัท ดี-ท้อปส์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- วงเงิน สั่งจ้าง จำนวนเงิน 1,019,600.00 บาท
- สัญญาเลขที่ 92/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567
- ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS วันที่ 14 มีนาคม 2567
- ส่งมอบพื้นที่ 22 มีนาคม 2567
- จำนวน 2 งวดงาน/ระยะเวลา 90 วัน

ทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาว 20.75 เมตร (โดยวิธีคัดเลือก)

งวดที่ 1 รายละเอียดดังนี้

- ดำเนินงานเทคอนกรีตเสาชั้น 1 แล้วเสร็จ
- ดำเนินงานเทคานรับพื้น คสล. ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการผูกเหล็กคานรับพื้น ชั้นที่ 2
- ประชุมอนุมัติวัสดุ และเร่งรัดติดตามงาน (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
- ประชุมเร่งรัดติดตามงาน (ครั้งที่ 2) วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
- ประชุมเร่งรัดติดตามงาน (ครั้งที่ 3) วันที่ 6 มิถุนายน 2567

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2567

คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาว 20.75 เมตร (โดยวิธีคัดเลือก)

งวดที่ 2 รายละเอียดดังนี้

- งานรื้อถอนผนัง, ชุบน้ำต่างอลูมิเนียม และสิ่งกีดขวางงานก่อสร้างอื่นๆ
- งานผนังเมทัลชีท
- งานพื้น และงานผนัง
- งานทาสี
- งานราวระเบียง
- งานตะแกรงกันนก
- งานระบบไฟฟ้า

และเก็บเศษวัสดุ พร้อมทำความสะอาด และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18 ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567

คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ดำเนินการแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

ภาพหน้างานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ณ ปัจจุบัน

