



**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**รายการงบประมาณลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**วงเงินทำสัญญา
รวม 27,520,800.- บาท**



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินทำสัญญา รวม 27,520,800.- บาท



รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงินทำสัญญา 11,101,400.- บาท
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 รายการ(จำนวน 11,101,400.- บาท)



รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงินทำสัญญา 16,419,400.- บาท
- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 รายการ (จำนวน 13,005,000.- บาท)

คงเหลือ จำนวน 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์เบิกจ่ายคิดเป็น 100 % รายการสิ่งก่อสร้างเบิกจ่ายคิดเป็น 79.21% รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นคิดเป็น 87.59%



“ การก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 (ครอบครัว) ”



โรงพยาบาลบุรีชัยพัฒน์ วงเงินสัญญา 8,100,000.- บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566

งวดที่ 1 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ค. 2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 2 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 20 ส.ค. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 3 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 4 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ย. 2566 (972,000.- บาท)

งวดที่ 5 (จำนวน 40 วัน) สิ้นสุดวันที่ 18 ธ.ค. 2566 (1,620,000.- บาท)

งวดที่ 6 (สุดท้าย) (จำนวน 70 วัน) สิ้นสุดวันที่ 27 ก.พ. 2567 (1,944,000.- บาท) (ส่งมอบงานได้ทันตามสัญญา)

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว


เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

*****คาดว่าจะสามารถดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
สิ้นสุดตามสัญญา*****

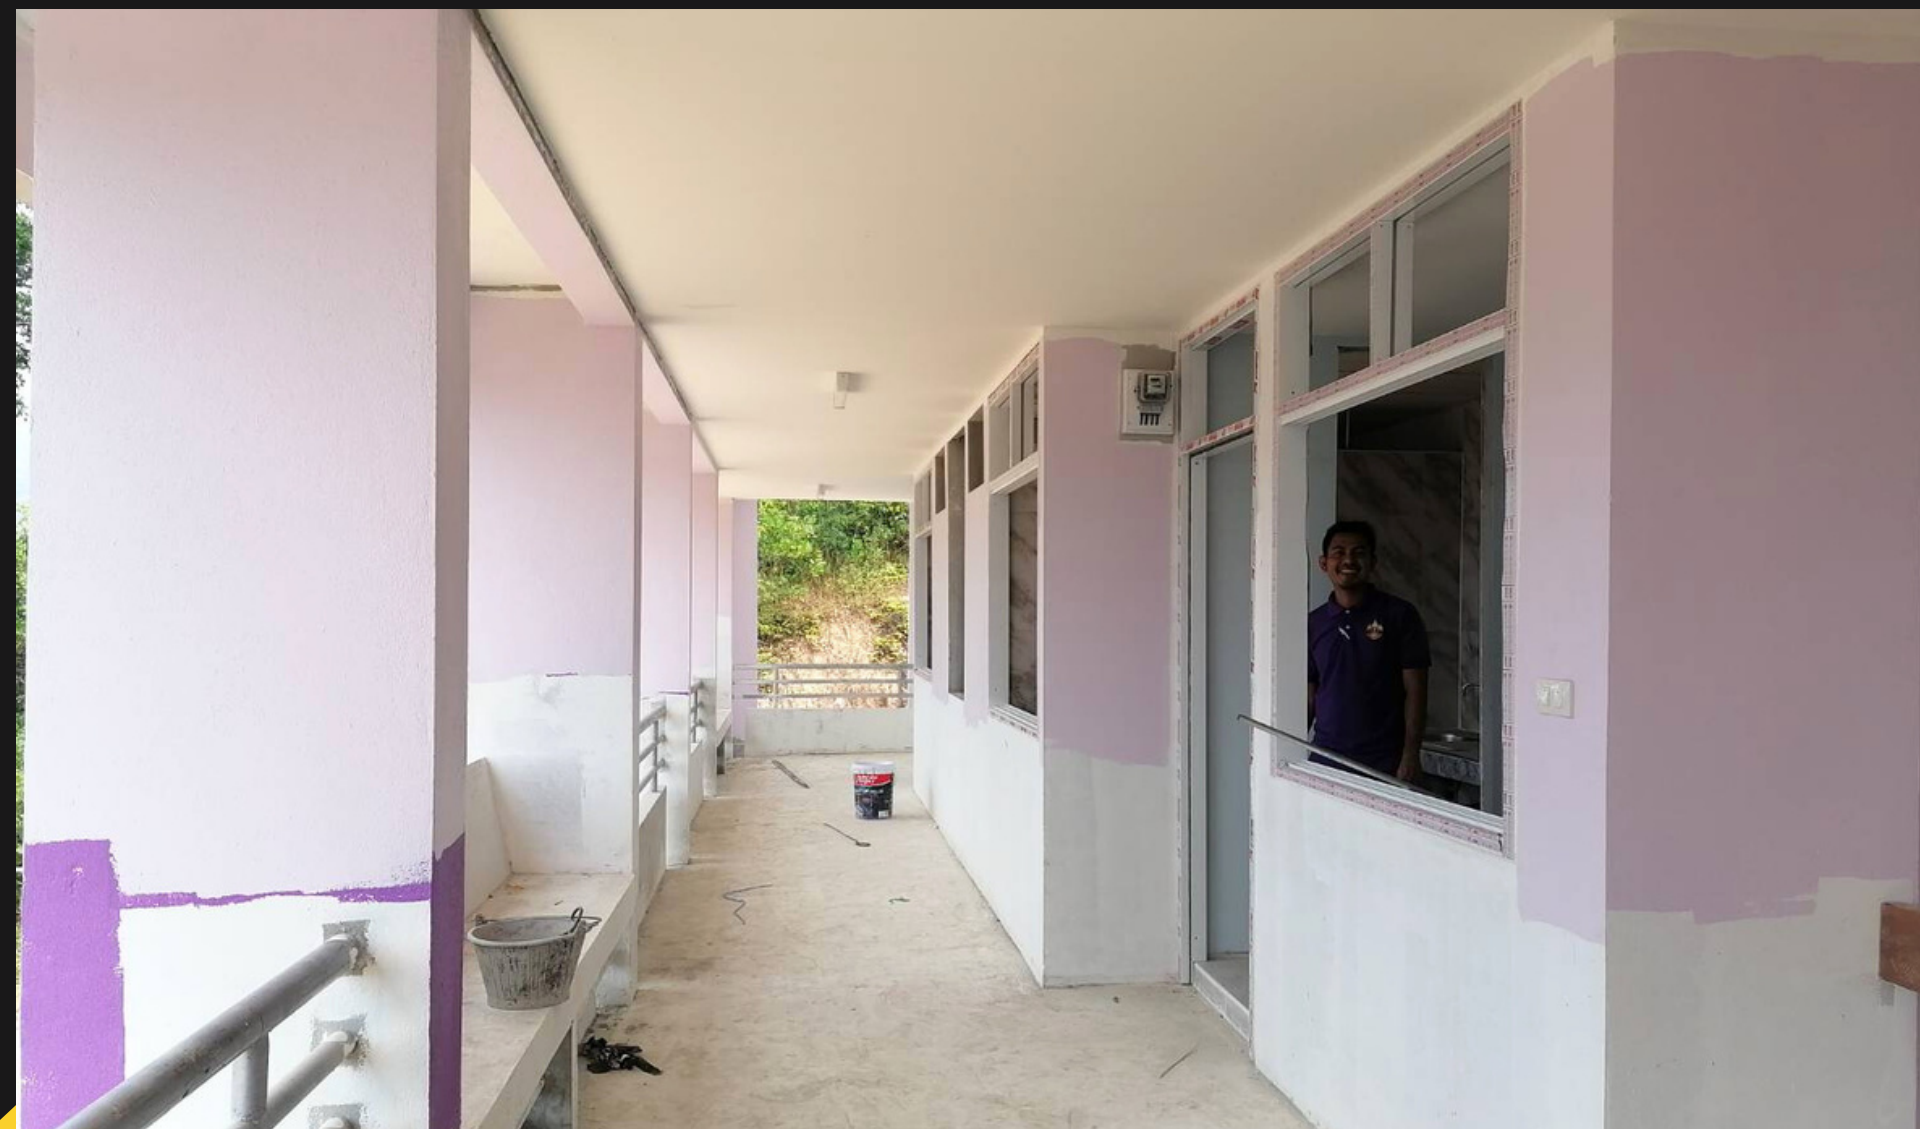



การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

(โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว

วงเงิน 1,470,400.- บาท



ดำเนินการจัดจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 12 มีนาคม 2567
งวดที่ 1 (จำนวน 60 วัน) สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย.2566 (205,856.- บาท)
งวดที่ 2 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 13 ธ.ค.2566 (249,968.- บาท)
งวดที่ 3 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 ม.ค.6567 (279,376.- บาท)
งวดที่ 4 (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 11 ก.พ.2567 (367,600.- บาท)
งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) (จำนวน 30 วัน) สิ้นสุดวันที่ 12 มี.ค.2567 (367,600.- บาท)



ผู้รับจ้างดำเนินการเข้าก่อสร้าง งวดที่ 1

***** คาดว่า ผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1
ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 *****
