

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 27,933,600.- บาท

❖ รายการ ครุภัณฑ์ วงเงิน 11,253,600.- บาท

เบิกจ่าย 5,753,600.- บาท

คิดเป็น 51 %

❖ รายการ สิ่งก่อสร้าง วงเงิน 16,680,000.- บาท

เบิกจ่าย 2,276,660.- บาท

คิดเป็น 13.65 %

รวมเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น 8,030,260.- บาท

คิดเป็น 28.75 %

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ วงเงิน 11,253,600.- บาท

- เบิกจ่าย 19 รายการ (จำนวน 5,753,600.- บาท)

- บริหารสัญญา 1 รายการ

*** คงเหลือ 2 รายการ (ยังไม่ลงนามในสัญญา)

รายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ วงเงิน 16,680,000.- บาท

- เบิกจ่าย 3 รายการ (จำนวน 2,276,660.- บาท)

- บริหารสัญญา 4 รายการ

*** คงเหลือ 1 รายการ (ยังไม่ลงนามในสัญญา)


บริหารสัญญา จำนวน 1 รายการ

1. เครื่องจักรห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ รพ.กะพงชัยพัฒนา (นัดตรวจรับ 2 พค. 66 วงเงิน 500,000 บาท)

บริหารสัญญา จำนวน 4 รายการ

1. บ้านพัก รพ.ทับปุด อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 3
2. บ้านพัก รพ.สต.ลำภี อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2
3. บ้านพัก รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1
4. ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางไทร อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2

ความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) รพ.ทับปุด
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,138,200.- บาท

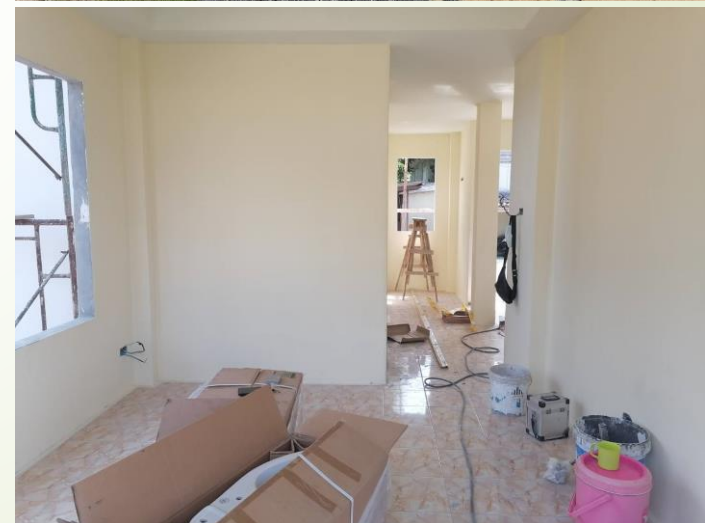

ส่งมอบงานแล้ว 2 งวด จาก 5 งวดงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 3 (สิ้นสุดสัญญา 17 มิย. 2566)

ความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/
ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.ลำภี อำเภอท้ายเหมือง
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,138,200.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว 1 งวด จาก 5 งวดงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 2 (สิ้นสุดสัญญา 19 มิย. 2566)

ความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/
ชำนาญการ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,479,600.- บาท(เพิ่ม 30% พื้นที่เกาะ)



อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวดที่ 1 จาก 5 งวด (สิ้นสุดสัญญา 10 กค. 2566)

ความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบางไทร วงเงินที่ได้รับจัดสรร 3,951,000.- บาท



ส่งมอบงานแล้ว 1 งวด จาก 6 งวดงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ 2 (สิ้นสุดสัญญา 12 กย. 2566)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ (ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา) ดังนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | วงเงิน | หน่วยที่ได้รับจัดสรร | ขั้นตอนการจัดซื้อ | คาดว่าจะลงนามในสัญญา |
|-------|--|-------|--------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 1 | รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | 1 | 2,500,000 | รพ.ตะกั่วทุ่ง | - e-bidding (ครั้งที่ 2) - รออุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา (20-28 เมย. 66) | พฤษภาคม |
| 2 | เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย | 1 | 2,500,000 | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | - (e-bidding) (ครั้งที่ 2) - รออุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา (25 เมย.- 3 พค. 66) | พฤษภาคม |
| | | | รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น | 5,000,000 | | |

ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง (ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา) ดังนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | วงเงิน | หน่วยที่ได้รับจัดสรร | ขั้นตอนการจัดจ้าง | คาดว่าจะลงนามในสัญญา |
|-------|---|-------|------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 1 | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) (งานส่วนที่เหลือ) | 1 | 8,153,000 | รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ | E-bidding ครั้งที่ 2 - แจ้งลงนามในสัญญา 270 วัน (6 งวด) | พฤษภาคม |
| | | | 8,153,000.- บาท | | | |
